Ambroise BISIAUX
Yony COLLARD
Louis BOLTZ
Louis NAVREZ
Alexandre FOURNIER
Matteo CIPOLAT

Gestion de projet - Agile

Sprint 1 2
Sprint 2 3
Sprint 3 5
Général 6

Sprint 1

User Stories prévues et validées

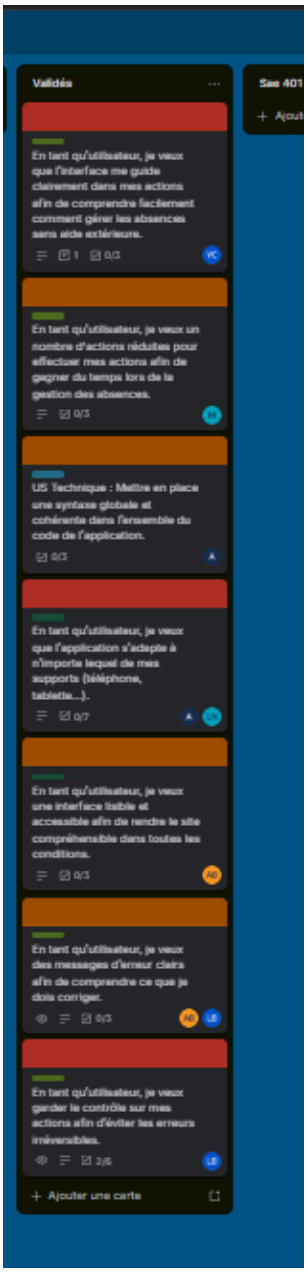

Sauf :



Burndown chart

Burndown Sprint 1	Ideal	Réalisé
0	54	54
0-3	48	54
3 - 6	41	49
6 - 9	34	40
9- 12	27	24
12-15	21	24
15-18	14	28
18-21	7	5
21-24	0	0

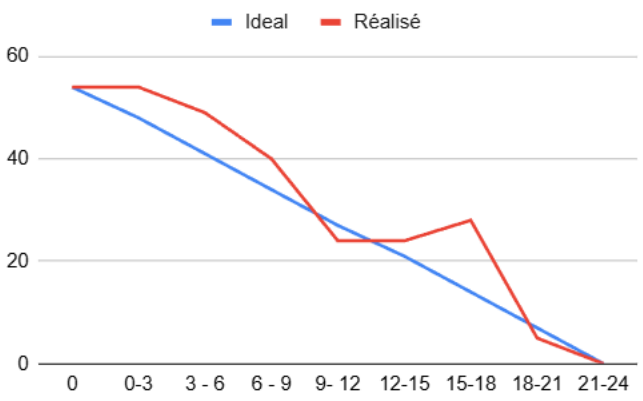

Sprint 2

User stories prévues et validées

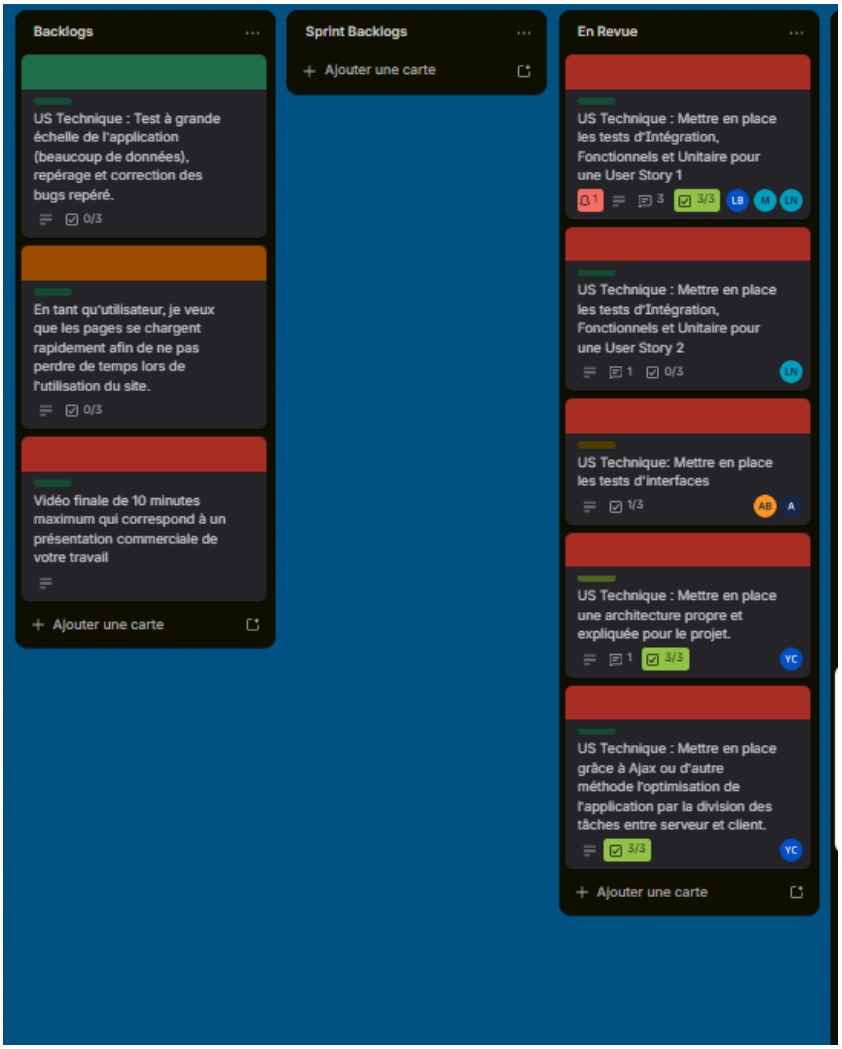

Burndown chart

Burndown Sprint 2	Ideal	Réalisé
0	94	94
0-3	83	94
3 - 6	71	89
6 - 9	59	76
9- 12	47	76
12-15	36	63
15-18	24	13
18-21	12	13
21-24	0	0

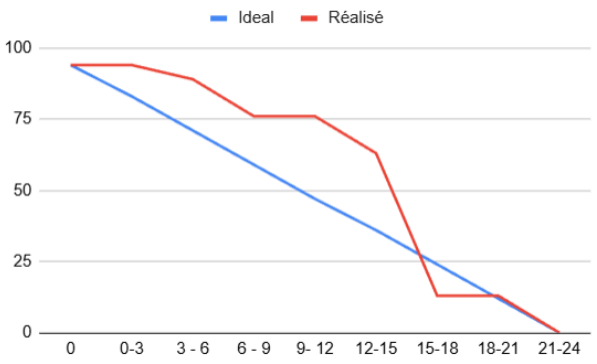

Sprint 3

User stories prévues :

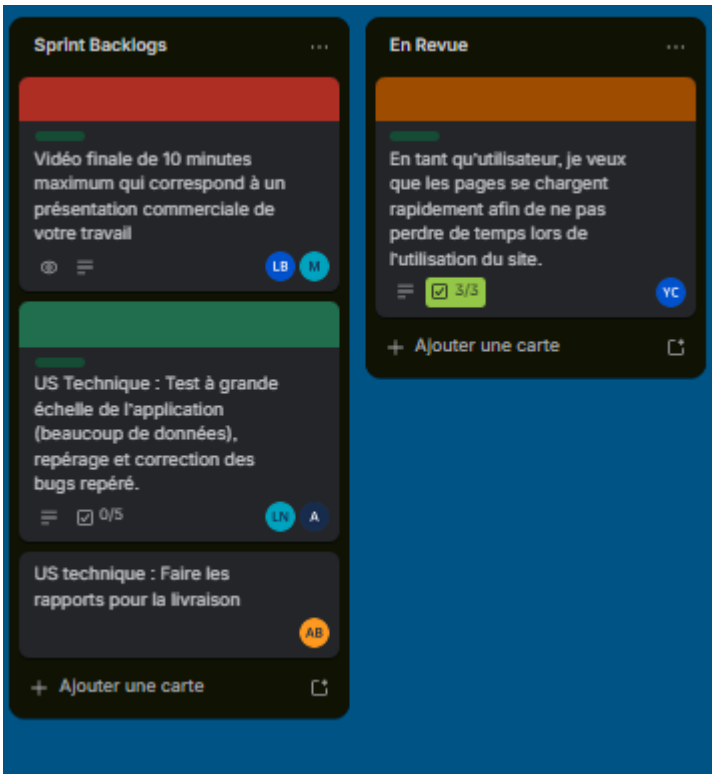

Burndown chart

Burndown Sprint 3	Ideal	Réalisé
0	39	39
0-3	34	39
3 - 6	30	26
6 - 9	25	26
9- 12	20	13
12-15	15	13
15-18	10	13
18-21	5	0
21-24	0	0

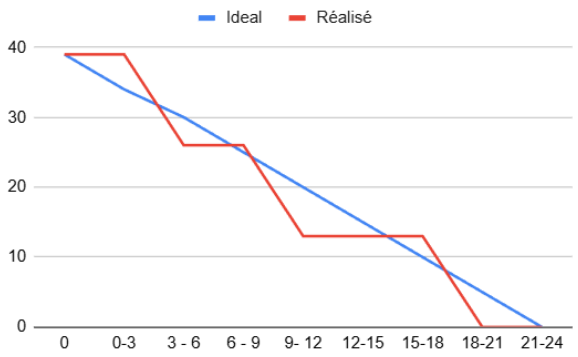

Général

Burndown chart générale du projet

Burndown chart	Ideal	Réalisé
Sprint 0	182	182
Sprint 1	122	133
Sprint 2	61	39
Sprint 3	0	

Graphe de vélocité

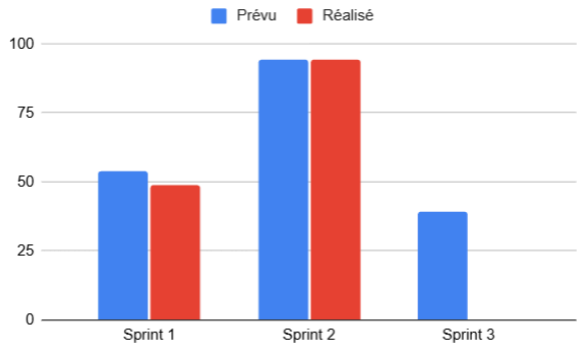

Graph de Velocité	Prévu	Réalisé
Sprint 1	54	49
Sprint 2	94	94
Sprint 3	39	

Etant donné que la revue du dernier sprint n'a pas encore eu lieu lors de l'écriture et du rendu de ce rapport, les graphiques qui nécessitent ces dernières stats sont incomplets.
